



# 【西新井陸橋長寿命化工事の交通規制の延伸について】

平成29年2月  
東京都第六建設事務所

## 【工事概要図】

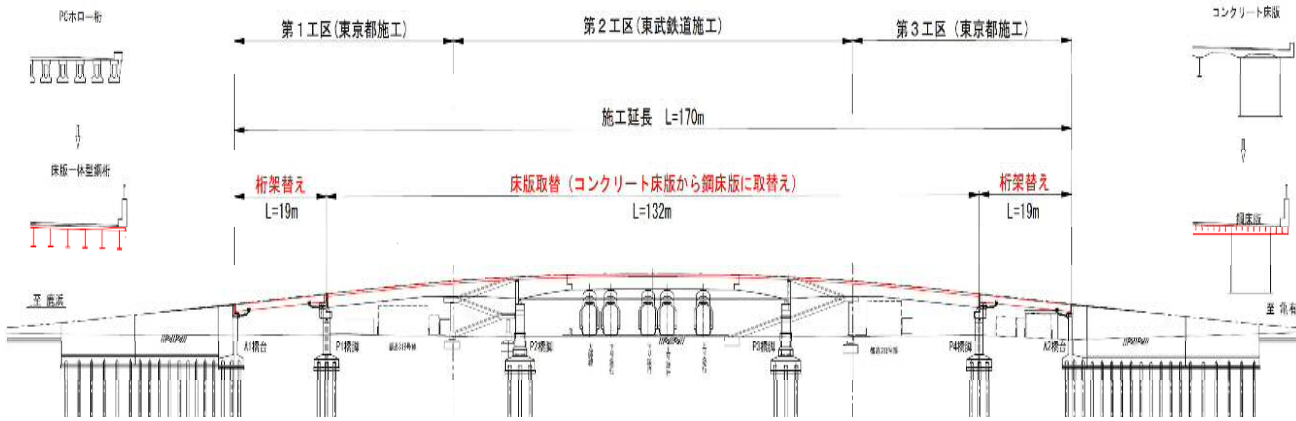

## 【施工ステップ図】

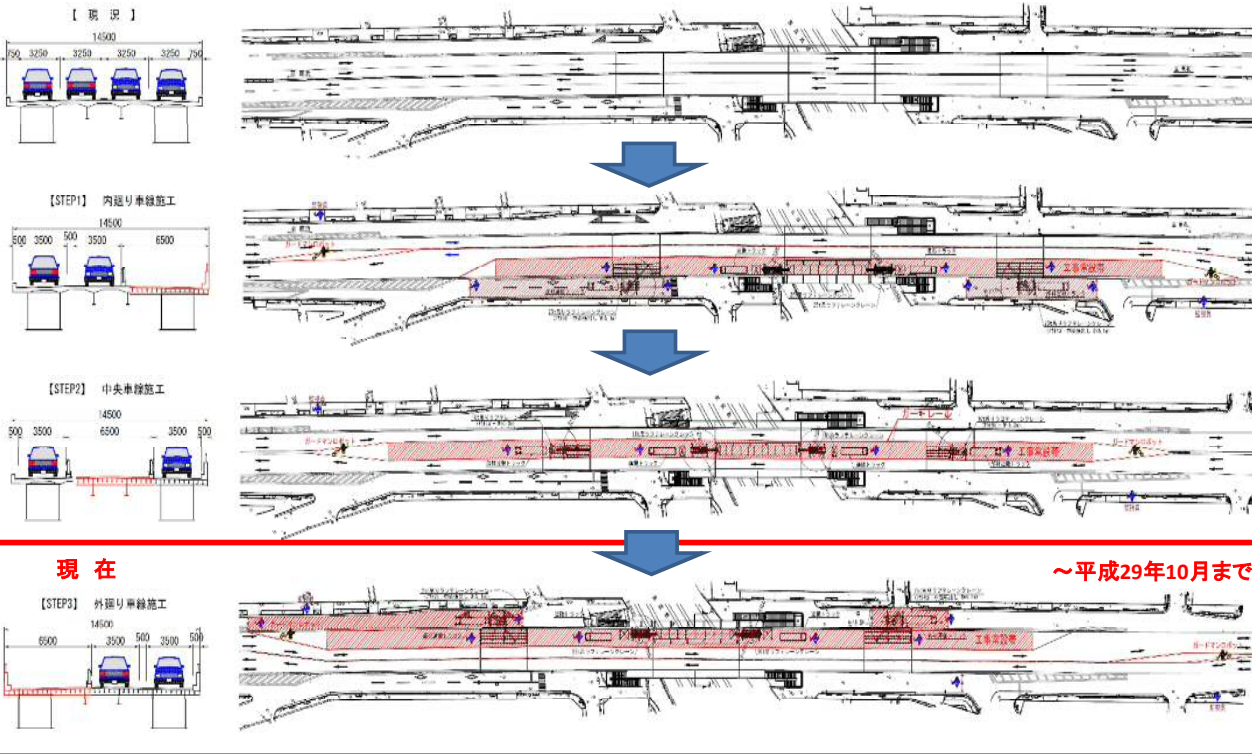

## 【全体工程表】

	平成28年												平成29年											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>STEP2</b> 中央車線 工事	→																							
<b>STEP3</b> 外回り車線 工事																								

当初 変更

※工程については、関係諸機関との調整により、変更となる場合があります。

### 交通規制の延伸の主な理由

#### 新たな鋼材の製作、追加工事等

設計時に確認できなかった橋桁の変状に対応するため、新たな鋼材の製作、追加工事等が生じたため。

- ① 複雑な構造と施工のため、設計・解析との差異
- ② 建設当時の橋桁の施工誤差(竣工図との相違)
